


01 | PLANTA BAIXA DA QUADRA POLIESPORTIVA  
ESC: 1/75


- PLANO DE REFORMA SIMPLIFICADO
- A REFORMA SE INICIARÁ, PREFERENCIALMENTE, PELAS DEMOLIÇÕES NECESSÁRIAS NAS ARQUIBANCADAS, COMO ESPECIFICADO EM DETALHES ESPECÍFICOS. NA SEQUÊNCIA, PROCEDE-SE COM AS DEMÁS DEMOLIÇÕES A SEREM REALIZADAS.
  - APÓS DECORRIDO TODOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, SUGERE-SE, PARA O BOM ANDAMENTO DA OBRA, QUE SEJA REALIZADA A LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS, PARA MELHOR ANDAMENTO DAS ETAPAS SUBSEQUENTES.
  - EM CONDIÇÕES DE PROSEGUIMENTO DOS SERVIÇOS, DEVE-SE EXECUTAR TODOS OS SERVIÇOS DE ALVENARIA NAS ARQUIBANCADAS (BLOCOS DE CONCRETO, FÓRMAS, CONCRETAGEM);
  - EM CONJUNTO COM OS ASSENTOS DAS ARQUIBANCADAS, EXECUTAR, AINDA, AS RAMPAS PRESENTES NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO;
  - FINALIZADOS OS SERVIÇOS DE ALVENARIA NAS ARQUIBANCADAS (E RAMPAS INTERNAS), PROCEDE-SE COM AS INSTALAÇÕES DOS GUARDA-CORPOS, CORRIMÕES E ALAMBRADOS.
  - FINALIZADOS OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ARQUIBANCADAS, DEVEM SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS NOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS:
    - REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE REPARO NA ALVENARIA NECESSÁRIOS;
    - EXECUTAR A PINTURA EM TINTA ÓLEO;
    - INSTALAR OS METAS E LOUÇAS HIDROSANITÁRIOS;
    - INSTALAR OS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO;
  - FINALIZADOS OS SERVIÇOS NAS ÁREAS MOLHADAS, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS;
  - EM PARALELO AOS SERVIÇOS DE ESQUADRIAS, DEVEM SER INSTALADAS AS LUMINÁRIAS E REFLETORES E OS SERVIÇOS DE REPARO NA COBERTURA (CALHAS E CONDUTORES DE PVC);
  - NA SEQUÊNCIA, DEVE-SE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES DE INCÊNDIO), CONFORME PROJETO TÉCNICO APROVADO NO CBMMG;
  - FINALIZADOS TODOS OS SERVIÇOS INTERNOS (EXCETO A INSTALAÇÃO DO PISO DA QUADRA), DEVEM SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS NA ÁREA EXTERNA (RAMPAS, ESCADAS, GUARDA-CORPOS, CORRIMÕES E CATRACAS);
  - APÓS O FIM DA PRIMEIRA ETAPA DE REFORMA, REALIZAR O PREPARO DO PISO DA QUADRA PARA O RECEBIMENTO DO NOVO PISO MODULAR EM POLIPROPILENO, CONFORME PADRÃO CBFS;
  - REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO DA QUADRA POR MEIO DE CONTRAPISO FORA DA ÁREA DE JOGO, VISANDO O NIVELAMENTO DA ÁREA DE JOGO E A ÁREA EXTERNA;
  - REALIZAR A PINTURA DA ÁREA EXTERNA À ÁREA DE JOGO, NA QUADRA, COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, EM TRÊS DEMÃOS;
  - INSTALAR O NOVO PISO MODULAR EM POLIPROPILENO, CONFORME PADRÃO CBFS.

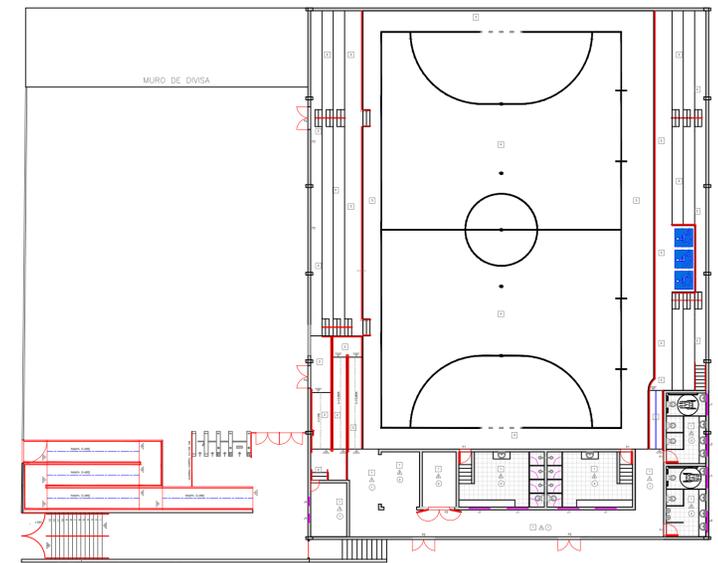

03 | CROQUI GERAL  
ESC: 1/200

ESPECIFICAÇÕES	
<input type="checkbox"/>	PISO
1	MANTER PISO CONSTRUÍDO
2	CONCRETO DESEMPENADO, COR NATURAL
3	CONCRETO DESEMPENADO, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS
4	PISO PARA QUADRA ESPORTIVA EM POLIPROPILENO, PADRÃO CBFS
<input type="checkbox"/>	PAREDE
1	MANTER PAREDE CONSTRUÍDA
2	PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS, NA COR MARFIM SOBRE LIXAMENTO
<input type="checkbox"/>	TETO
1	MANTER LAJE/FORRO/PINTURA CONSTRUÍDO (S)
2	PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS, NA COR MARFIM SOBRE LIXAMENTO

QUADRO DE ESQUADRIAS	
<b>JANELAS</b>	
J1	- JANELA BASCULANTE, ESTRUTURA DE FERRO PINTADA EM BRANCO GELO E PAINES DE VIDRO COMUM - 150x40cm (L x H)
J2	- JANELA BASCULANTE, ESTRUTURA EM FERRO PINTADA EM BRANCO GELO E PAINES DE VIDRO COMUM - 120x40cm (L x H)
J3	- JANELA DE CORRER, ESTRUTURA EM FERRO PINTADA EM BRANCO GELO E PAINES DE VIDRO COMUM - 150x100cm (L x H)
J4	- JANELA PIVOTANTE, ESTRUTURA DE FERRO PINTADA EM BRANCO GELO E PAINES DE CHAPA METÁLICA FINA, - 60x40cm (L x H)
J5	- JANELA PIVOTANTE, ESTRUTURA DE FERRO PINTADA EM BRANCO GELO E PAINES DE VIDRO COMUM - 60x40cm (L x H)
<b>PORTAS</b>	
P1	- PORTA DE MADEIRA, FOLHA USA SIMPLES, ENVERNIZADA - 80x210cm (L x H)
P2	- PORTA CORTA FOGO METÁLICA, TIPO P90, FOLHA DUPLA - 160x210cm (L x H)
P3	- PORTA DE MADEIRA, FOLHA USA SIMPLES, ENVERNIZADA - 150x210cm (L x H)



02 | PLANTA BAIXA DO PALCO  
ESC: 1/100

ENDEREÇO DA OBRA					
LOGRADOURO:	NÚMERO:	BAIRRO:	COMPL:	CIDADE:	UF:
RUA OTAVIO PINTO DE OLIVEIRA	-	CENTRO	-	PIRACEMA	MG
PROJETO					
OA	15/08/2018	DJAP	EMIÇÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO		
IDENTIFICAÇÃO: PES-1813-ARQ-PE-01-REV02-A1				ÁREA CONS.: 1.067,84 m²	
TÍTULO: REFORMA DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL ZIZICO PAULINO				USO: ESPORTES	
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DE IMPLANTAÇÃO; MEMORIAL DE DEMOLIÇÃO; MEMORIAL DE REFORMA; QUADRO DE ESQUADRIAS; ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS				DATA: 15/08/2018	
				ESCALA: INDICADA	
RESPONSÁVEIS					
PROPRIETÁRIO:			CPF: 17.980.392/0001-03		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			CREAMG: 201.765/D		
DOUGLAS JUNIO ALCANTARA PENA					
COMO RT DECLARO QUE O PROJETO ORA APRESENTADO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE.					



TIPO: NOME ARQUIVO: FOLHA: 01/05  
ARQ: PES-ARQ-PL-01
